Projekt		
Va Västanvik Norrtälje		
Utfärdad	Reviderad	Ansvarig
2021-02-11	2021-08-17	Anders Larsson

Aktiviteter
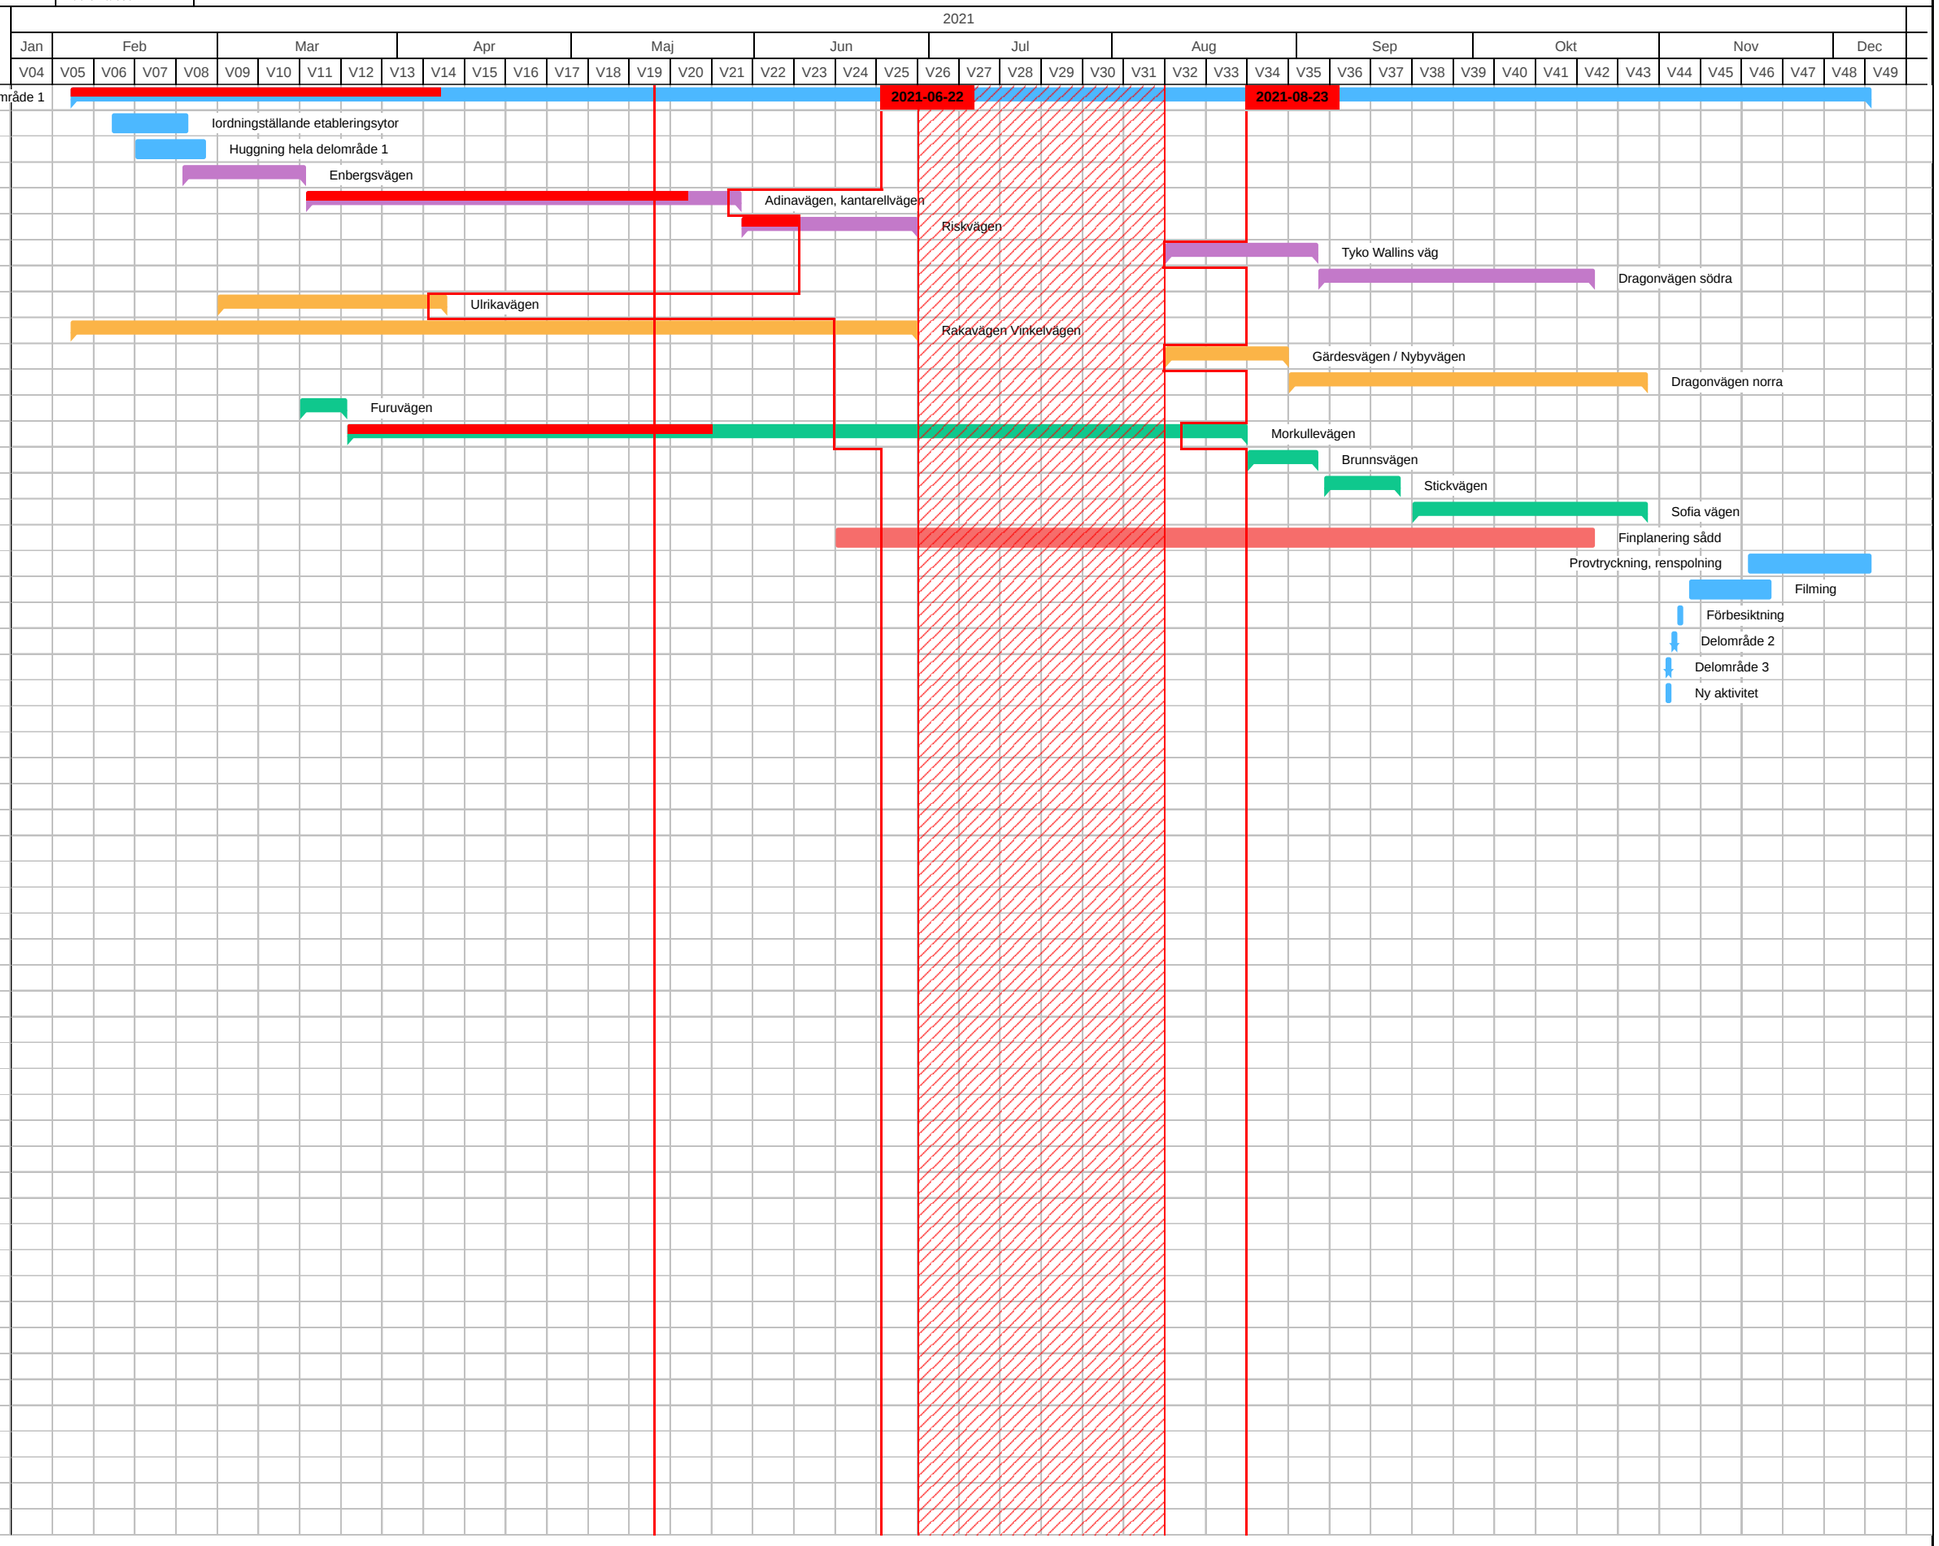
Aktivitet	Start	Bd	%
Delområde 1	**2021-02-04**	**188**	**2**
Iordningställande etablerings	2021-02-11	9	0
Huggning hela delområde 1	2021-02-15	10	0
Enbergsvägen	**2021-02-23**	**15**	**0**
Adinavägen, kantarellväge	**2021-03-16**	**54**	**88**
Riskvägen	**2021-05-29**	**20**	**34**
Tyko Wallins väg	**2021-08-09**	**20**	**0**
Dragonvägen södra	**2021-09-04**	**33**	**0**
Ulrikavägen	**2021-03-01**	**29**	**0**
Rakavägen Vinkelvägen	**2021-02-04**	**102**	**0**
Gärdesvägen / Nybyvägen	**2021-08-09**	**15**	**0**
Dragonvägen norra	**2021-08-30**	**45**	**0**
Furuvägen	**2021-03-15**	**6**	**0**
Morkullevägen	**2021-03-23**	**79**	**41**
Brunnsvägen	**2021-08-23**	**10**	**0**
Stickvägen	**2021-09-05**	**10**	**0**
Sofia vägen	**2021-09-20**	**30**	**0**
Finplanering sådd	2021-06-14	63	0
Provtryckning, renspolning	2021-11-16	15	0
Filming	2021-11-06	10	0
Förbesiktning	2021-11-04	1	0
Delområde 2	**2021-11-03**	**1**	**0**
Delområde 3	**2021-11-02**	**1**	**0**
Ny aktivitet	2021-11-02	1	0
